

ALLEGATO 1 – ESEMPIO DI «FINE LAVORI» PER UN CANTIERE
DI RICOSTRUZIONE DELLE SCUOLE A L'AQUILA (Polo
scolastico di San Sisto – Santa Barbara)



Dossier sullo stato della
ricostruzione delle scuole a
L'Aquila

Aggiornamento n.20: 24 novembre 2024



Comune dell'Aquila





IL SINDACO DELL'AQUILA

Commissario art. 7-ter D.L. 22/2020

validazione esecutivo	approvazione esecutivo	inizio lavori	fine lavori prevista					
04/07/2023	01/12/2023	30/10/2023	16/05/2025					

2. Ricostruzione del Polo scolastico San Sisto Santa Barbara.

R.U.P.	Arch. Roberto Evangelisti
Importo dell'intervento	€ 6.524.686,00
	Decreto CDR 89/2011 € 800.568,75
Finanziamento	Decreto DISET 48/2013 € 3.000.000,00
	CIPE 72/2020 € 2.724.117,00

Il progetto riguarda la demolizione e ricostruzione di una scuola primaria per due sezioni, di una scuola per l'infanzia dimensionata per tre sezioni e di una palestra a servizio delle scuole, ma anche a servizio della comunità. L'appalto è stato suddiviso in due lotti funzionali, il primo riguardante la demolizione, lo spianamento del lotto e la costruzione di una paratia di sostegno e il secondo la ricostruzione.

Il lotto relativo alla demolizione, relativo allo spianamento del lotto e la costruzione di una paratia, è concluso; i lavori della demolizione sono stati ultimati.

Cronologia recente

- Con decreto n. 114 del 21 maggio 2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ricostruzione.
- È stato approvato il progetto esecutivo per la ricostruzione.
- Le offerte sono pervenute il 30/04/2022
- In data 12/07/2022 si è proceduto con l'aggiudicazione provvisoria.
- In data 04/08/2022 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva.
- I lavori sono iniziati in data 5/08/2022
- **La fine lavori prevista è il 24/12/2024.**



Cronoprogramma

	fine lavori prevista							
inizio lavori								
05/08/2022	24/12/2024							

Stato del cantiere del Polo Scolastico San Sisto – Santa Barbara al 29 dicembre 2024 (data prevista «fine lavori: 24 dicembre 2024)



Stato del cantiere del Polo Scolastico San Sisto – Santa Barbara al 29 dicembre 2024 (data prevista «fine lavori: 24 dicembre 2024)

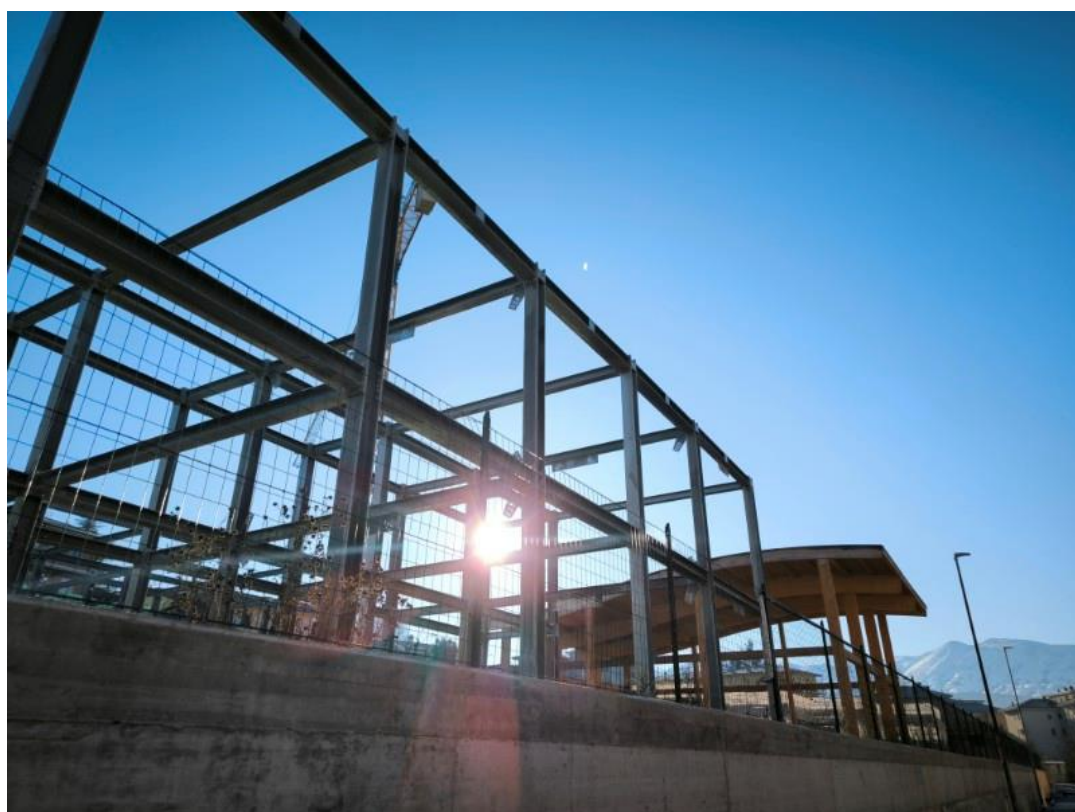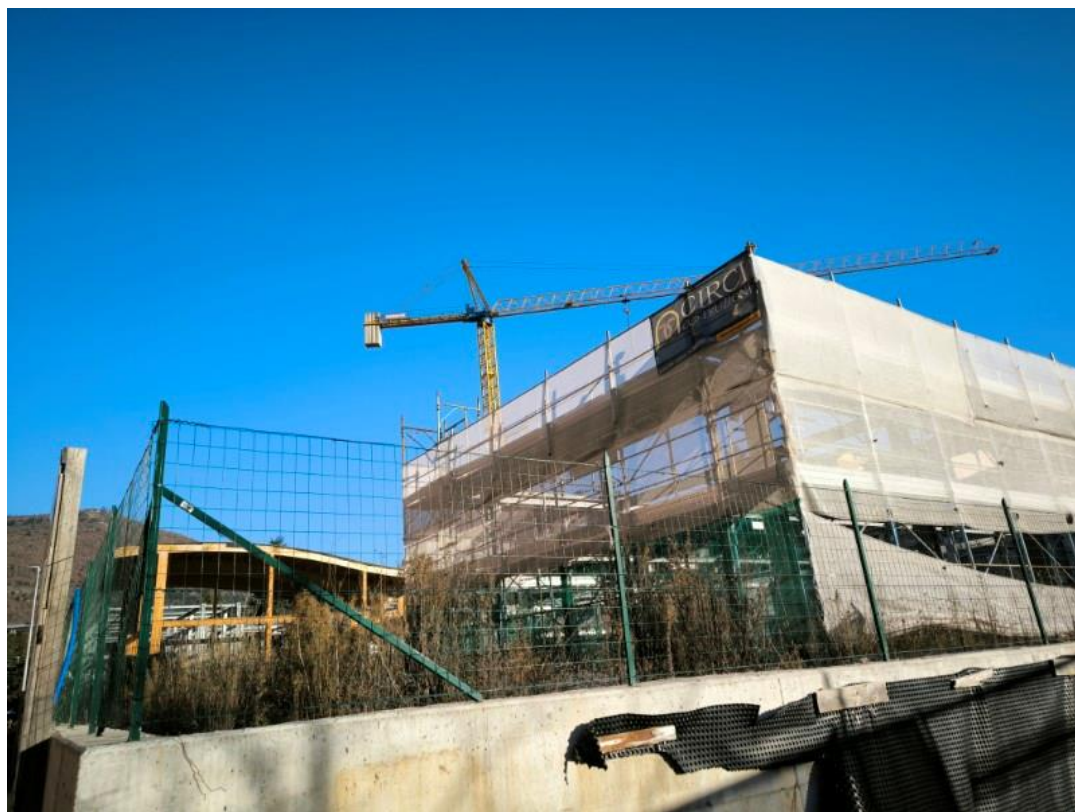

ALLEGATO 2 – Indici di vulnerabilità sismica dele scuole comunali dell’Aquila – dati di ottobre 2024

	Istituto Comprensivo	Scuola	Tipologia costruttiva	SLV	SLD	SLO
1	Rodari	Primaria Preturo				
2	Dante Alighieri	Infanzia Capocroce	CEMENTO ARMATO	0	0,196	5,96
3	Dante Alighieri	Primaria Torrione	CEMENTO ARMATO	0,151		
4	Rodari	Infanzia S. Benedetto di Bagno	CEMENTO ARMATO	0,151		
5	Mazzini	Primaria Pile	MURATURA	0,22	0,55	5,288
6	Rodari	Infanzia Pagliare di Sassa	CEMENTO ARMATO	0,273		
7	Dante Alighieri	Infanzia Gianni Di Genova	MURATURA	0,33	3,326	2,673
8	Dante Alighieri	Primaria Gianni di Genova	CEMENTO ARMATO	0,332		
9	Dante Alighieri	Primaria San Francesco	CEMENTO ARMATO	0,332		
10	Rodari	Infanzia Preturo	CEMENTO ARMATO	0,356		
11	Paganica	Primaria Paganica	CEMENTO ARMATO	0,45	1,48	
12	Mazzini	L'Aquila San Sisto	CEMENTO ARMATO	0,46	0,52	
13	Paganica	Infanzia "L'albero dai mille colori"	CEMENTO ARMATO	0,603	1	
14	Carducci	Infanzia Collodi Valle Pretara	CEMENTO ARMATO	0,605	1	
15	Paganica	Infanzia "Peter Pan"	CEMENTO ARMATO	0,606	1	
16	Patini	Infanzia Coppito	CEMENTO ARMATO	0,61	1	
17	Patini	Scuola Media Patini	CEMENTO ARMATO	0,615	1,51	
			PREFABBRICATA	0,743		

Fonte: <https://news-town.it/2024/10/23/affari-pubblici/laquila-pd-11-scuole-su-17-al-di-sotto-dellindice-di-vulnerabilita/>

ALLEGATO 3 – Immagini dell’incontro del Comitato
«Scuole Sicure» e della «Commissione Oltre il MUSP» con
il Presidente della Repubblica Italiana, settembre 2019

